Verkehrs-führungs-phase	Kurzbeschreibung Bauarbeiten	Einlage	Dauer
0	Vorwegmaßnahme STM: Befestigung südl.Bankett B21 Ri. VLSA Fischaberg Adaptierung Mittelinseln KV West und Ost	300	
	Baustelle einrichten		
1	Vorwegmaßnahme STM - Errichtung Provisorium Bypass 3, KV West Adaptierung P&D-Anlagen	301	
2	Umlegung Wirtschaftsweg Erdarbeiten Verbreiterung Rampe 3 Ri. Osten Erdarbeiten Bypass 4 Erdarbeiten Rechtseinbiegestreifen Verbreiterung B21 Ri. Süden inkl. Bypass 1 und 5	302	
3	R2, Sperre & Sanierung	303	
4	Verbreiterung B21 Ri. Süden inkl. Bypass 1 und 5 B21 KV West bis VLSA Fischaberg, nördlicher FS VLSA Fischaberg, Betonfelder R1, Sanierung Halbseitig Betonfelder R3, Verbreiterung Ri. WiWe inkl. Bypass und B21	304	
5	B21 KV West bis VLSA Fischaberg, nördlicher FS VLSA Fischaberg, Sanierung Rechtseinbiegestreifen VLSA Fischaberg, Betonfelder R1, Sanierung Halbseitig Betonfelder R3, Verbreiterung Ri. WiWe inkl. Bypass und B21	305	
6	R5, Sperre & Sanierung	306	
7	B21 KV West bis VLSA Fischaberg, mittlerer FS R1, Sanierung Halbseitig Betonfelder R3, Verbreiterung Ri. WiWe inkl. Bypass und B21	307	
8	B21 KV West bis VLSA Fischaberg, mittlerer FS R1, Sanierung Halbseitig Betonfelder R4, Umbau Rampe 4 R3, Verbreiterung Ri. A2/R4	308	
9	B21 KV West bis VLSA Fischaberg, südlicher FS R4, Umbau Rampe 4 R3, Verbreiterung Ri. A2/R4	309	
10	B21 KV West bis VLSA Fischaberg, südlicher FS R1, Sanierung Halbseitig Bypass R4, Umbau Rampe 4 R3, Verbreiterung Ri. A2/R4	310	
11	B21 zwischen KVs, nördlicher Fahrstreifen B21 R1, Sanierung Halbseitig Bypass R4, Umbau Rampe 4 R3, Verbreiterung Ri. A2/R4	311	
12	B21 zwischen KVs, nördlicher Fahrstreifen B21 R1, Sanierung Halbseitig Bypass R3, Verbreiterung Ri. A2/R4 R3, Betonfelder	312	
13	R4, Sperre & Sanierung	313	
14	B21 zwischen KVs, mittlerer Bereich B21 R1, Sanierung Halbseitig Bypass R3, Betonfelder	314	
15	B21 zwischen KVs, nördlicher Fahrstreifen B21 R3, Betonfelder R3, Bereich unter Objekt A02.Ü29	315	
16	B21 zwischen KVs, Asphalt R3, Bereich unter Objekt A02.Ü29	316	
17	B21 zwischen KVs, Asphalt Sanierung KV Ost bis WiWe, AS mittlerer Bereich	317	
18	B21 zwischen KVs, Asphalt Sanierung KV Ost bis WiWe, AS nördlicher Bereich	318	
19	R3, Sperre Deckschicht	319	
20	Nachtbaustelle VLSA Fischaberg Süd	320	
21	Nachtbaustelle VLSA Fischaberg Nord	321	
22	Sanierung KV Ost bis WiWe, AS in Nachtbaustellen	322	
23	Sanierung restliche Betonfelder KVs in Nachtbaustellen	323	

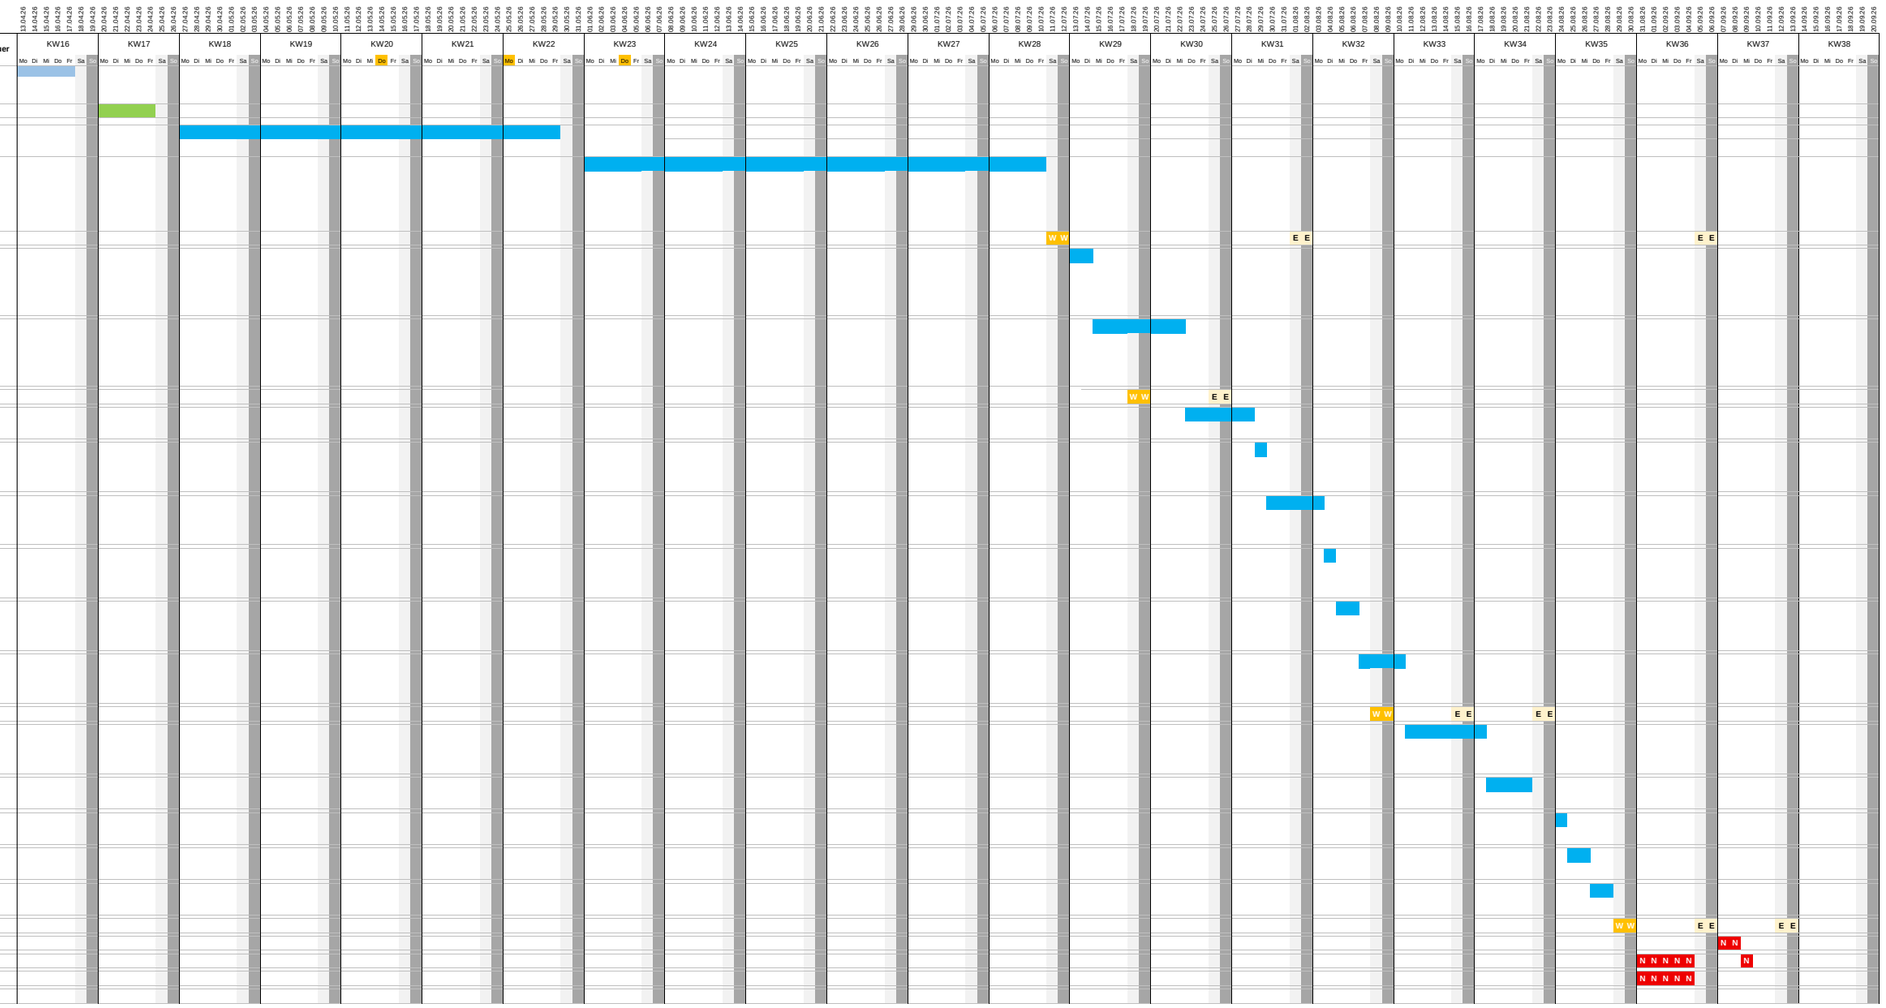

Legende

- Verkehrsführungsphase STM
- Verkehrsführungsphase AN-Bau
- N Nachtarbeiten
- W Wochenendsperren Rampenfahrbahnen
- E Ersatzwochenende für Rampensperren
